


月間工事予定表	工事名	国道22号一宮浅野電線共同溝PFI事業	工事期間	自 令和5年6月26日 至 令和9年3月31日	事業主：大林・大日・東建 コンソーシアム	現場事務所 TEL (0586-64-6623) FAX (0586-64-6624)	
	工事場所	愛知県一宮市島崎1丁目～一宮市緑5丁目	月間期間	自 令和7年5月1日 至 令和7年5月31日		施工業者：大林道路株式会社	現場代理人 携帯 (070-7606-2787)
						監理技術者 甲斐 寛士	現場代理人 佐藤 和也

工事種類	施工区間	2025年5月					備考
		1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	
電線 共同溝工	管路工 23.05kp～22.85kp (上り線)	休工					抑制期間 4月26日～5月6日 抑制期間中は作業を 行いません。
	管路工 23.05kp～22.85kp (上り線) (夜間)	休工					
	遮音壁撤去 21.89kp～22.08kp (下り線)	休工					
	特殊部工 21.89kp～22.08kp (下り線)	休工					

作業予定


規制種類	2025年5月					
	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	土日祝
車線1/3規制	×	○	○	○	○	×
歩道規制	×	○	○	○	○	×
車線1/3規制	: 10:00～16:00			○ : 規制有		
歩道規制	: 9:00～17:00			× : 規制無		
車線1/3規制・歩道規制 (夜間)	: 22:00～翌6:00					

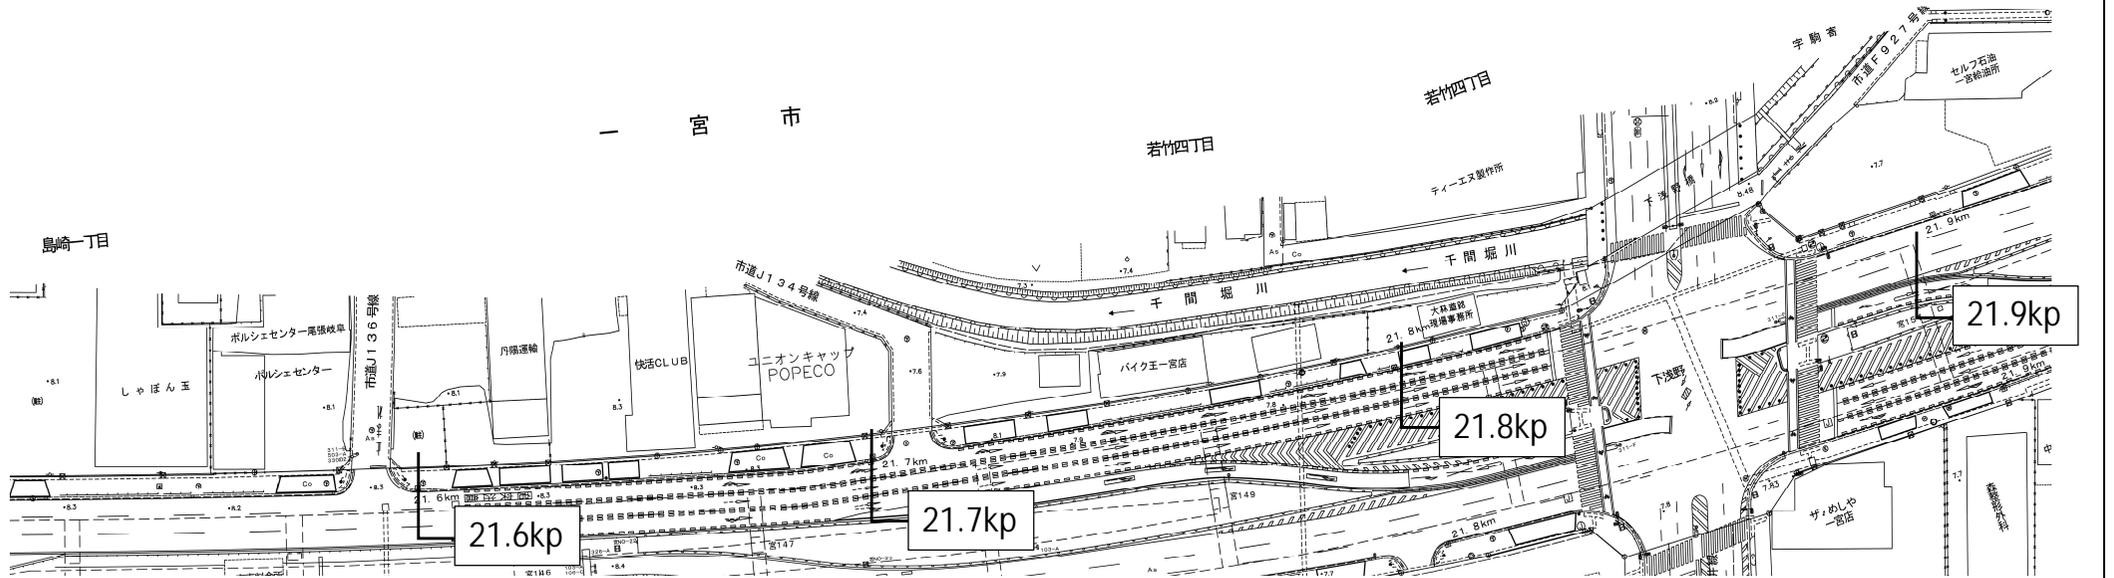

← 名古屋方面

岐阜方面 →

遮音壁撤去：2週目～3週目

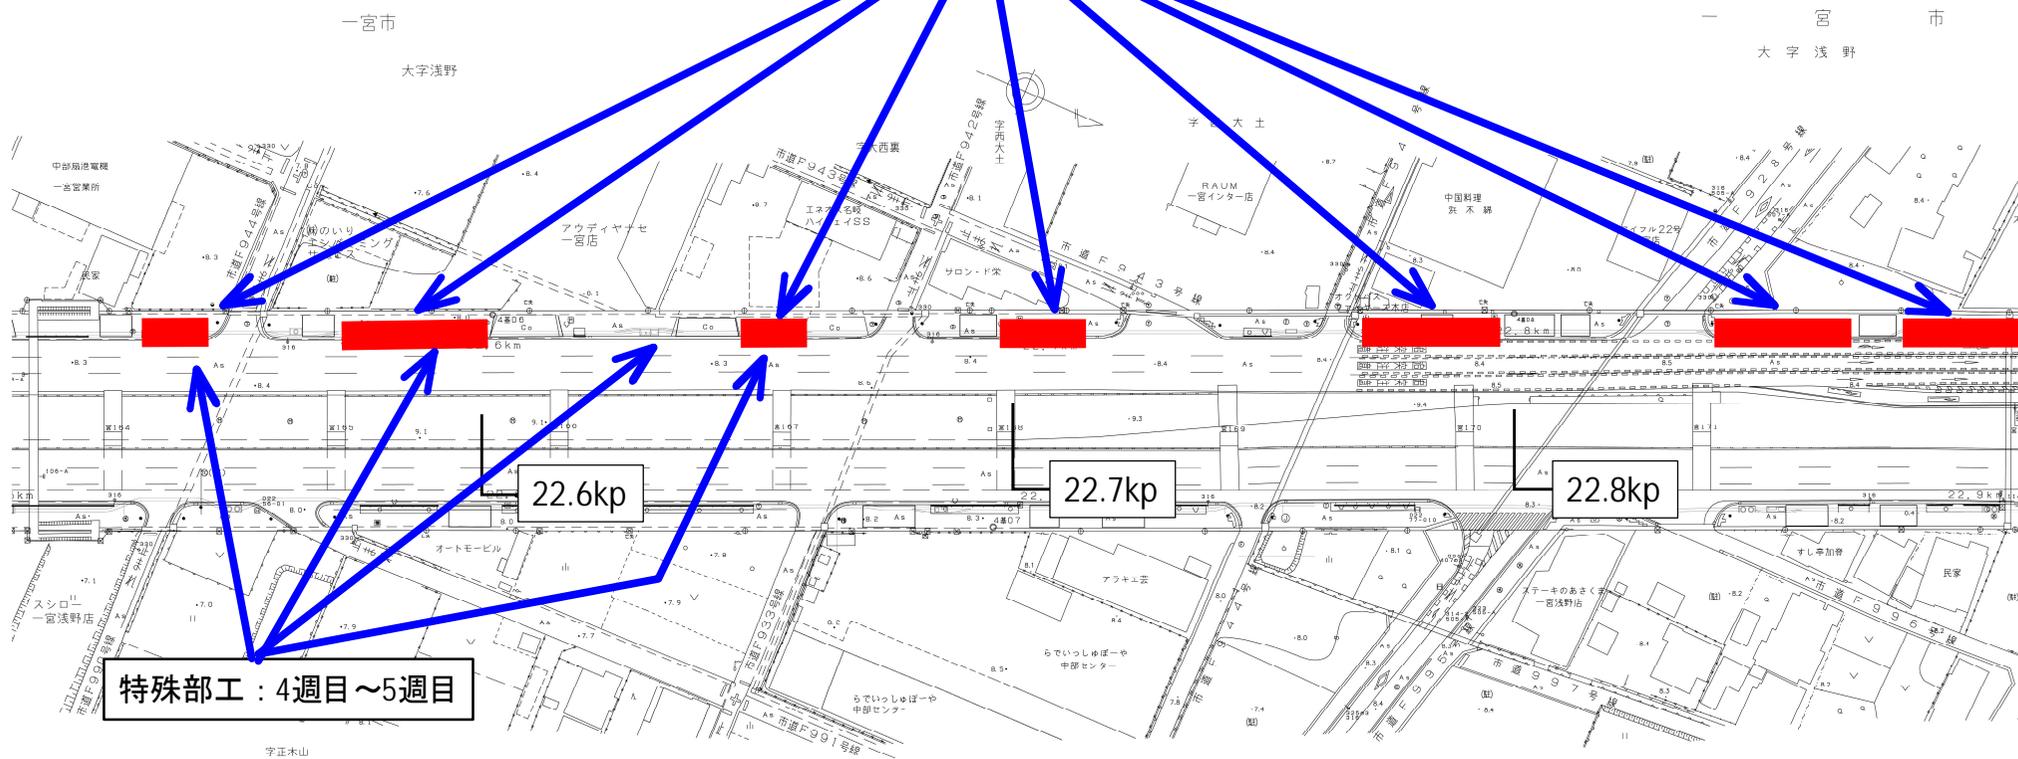

特殊部工：4週目～5週目

← 名古屋方面

岐阜方面 →

大字 浅野

字 大曲リ

遮音壁撤去：2週目～3週目

22.8kp

22.9kp

23.0kp

管路工：2週目～3週目、5週目

管路工：2週目～3週目、5週目

管路工（夜間）：4週目

名古屋方面

岐阜方面
